GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: FISMDF 004/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE LOPEZ MATEOS
FISMDF 018/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA AGUASCALIENTES LORETO Y CALLE LÓPEZ MATEOS

Ubicación: COLONIA MACARIO J. GÓMEZ

Tipo de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022

Programa: SD ALCANTARILLADO

Subprograma: 01 REHABILITACIÓN

Residente: Ing.Carlos Armando Chávez García

Contrato: FISMDF 004-018/2022

Contratista: MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

Inicio Vigente: lunes, 1 de agosto de 2022

Inicio Real: lunes, 1 de agosto de 2022

Fin Vigente: jueves, 29 de septiembre de 2022


Fin Real: jueves, 29 de septiembre de 2022

Días de Obra: 60 dias

Monto Contratado: $1,095,225.54

Monto Ejercido: $1,095,225.54

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	01/08/2022	0.00%	0.00%	50.0%
2	08/08/2022	5.12%	9.41%	50.0%
3	15/08/2022	11.01%	14.56%	50.0%
4	22/08/2022	23.56%	26.12%	50.0%
5	29/08/2022	41.69%	43.13%	50.0%
6	05/09/2022	51.32%	55.75%	68.9%
7	12/09/2022	57.31%	59.63%	72.0%
8	19/09/2022	84.68%	56.23%	72.0%
9	26/09/2022	98.47%	99.17%	76.5%
10	03/10/2022	100.00%	100.00%	76.5%
11	10/10/2022	100.00%	100.00%	76.5%
12	17/10/2022	100.00%	100.00%	93.1%
13	24/10/2022	100.00%	100.00%	93.1%
14	31/10/2022	100.00%	100.00%	100.0%

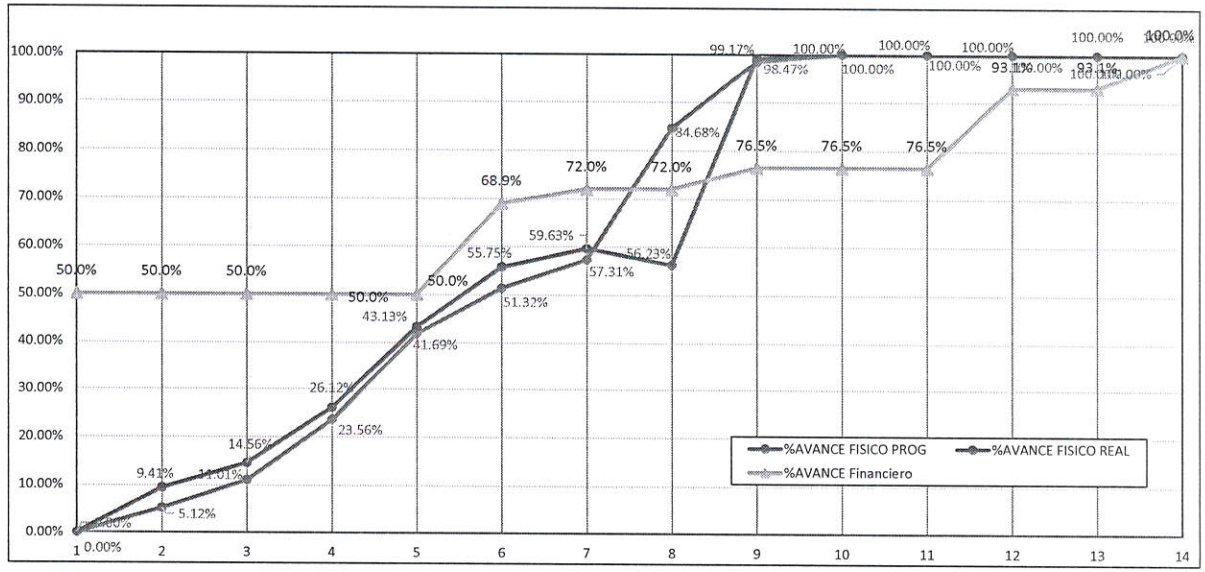

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
