GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **PF 001B/2026 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - TRABAJOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES DE CABECERA MUNICIPAL, COMUNIDAD DE AMAPOLAS DEL RÍO Y COMUNIDAD BORROTES, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. Y ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA LOS LIRIOS, CENTROS COMUNITARIOS EN PUERTECITO DE LA VIRGEN Y FRACC. LA RIBERA Y ESCULTURA MONUMENTAL EN COLONIA SAN JOSÉ DE BUENAVISTA.**

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Contrato: PF 001 B/2026

Contratista: INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.

Inicio Vigente: viernes, 20 de marzo de 2026

Días de Obra: 35

Inicio Real: viernes, 20 de marzo de 2026


Monto Contratado: $ 509,477.61

Fin Vigente: jueves, 23 de abril de 2026

Monto Ejercido: $ 509,477.61

Fin Real: jueves, 23 de abril de 2026

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/03/2026	23.52%	23.52%	0.00%
2	28/03/2026	45.08%	45.08%	0.00%
3	04/04/2026	73.42%	73.42%	0.00%
4	11/04/2026	87.37%	87.37%	0.00%
5	18/04/2026	98.85%	98.85%	0.00%
6	25/04/2026	100.00%	100.00%	0.00%
7	02/05/2026	100.00%	100.00%	0.00%
8	09/05/2026	100.00%	100.00%	0.00%
9	16/05/2026	100.00%	100.00%	100.00%

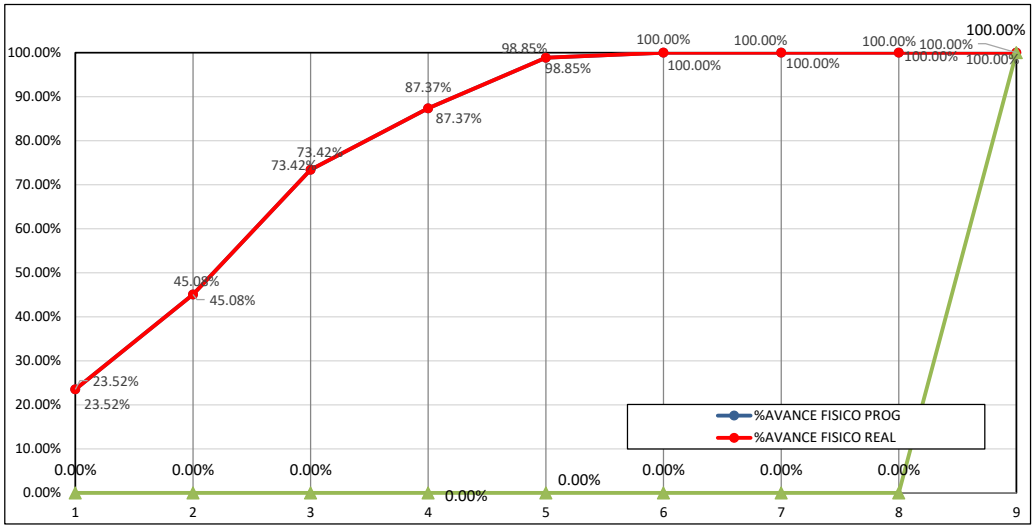

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
