GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **PF 001 C/2026 TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 10 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA).**

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Contrato: PF 001 C/2026

Contratista: CONSTRUCCIONES DISEÑART, S.A. DE C.V.

Inicio Vigente: viernes, 8 de mayo de 2026

Días de Obra: **230**

Inicio Real: viernes, 8 de mayo de 2026


Monto Contratado: **$ 271,989.48**

Fin Vigente: miércoles, 23 de diciembre de 2026

Monto Ejercido:

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/05/2026	0.00%	0.00%	0.00%
2	30/05/2026	0.00%	0.00%	0.00%
3	15/06/2026	2.29%	2.29%	0.00%
4	30/06/2026	4.85%	4.85%	0.00%
5	15/07/2026			
6	30/07/2026			
7	15/08/2026			
8	30/08/2026			
9	15/09/2026			
10	30/09/2026			
11	15/10/2026			
12	30/10/2026			
13	15/11/2026			
14	30/11/2026			
15	15/12/2026			
16	30/12/2026			

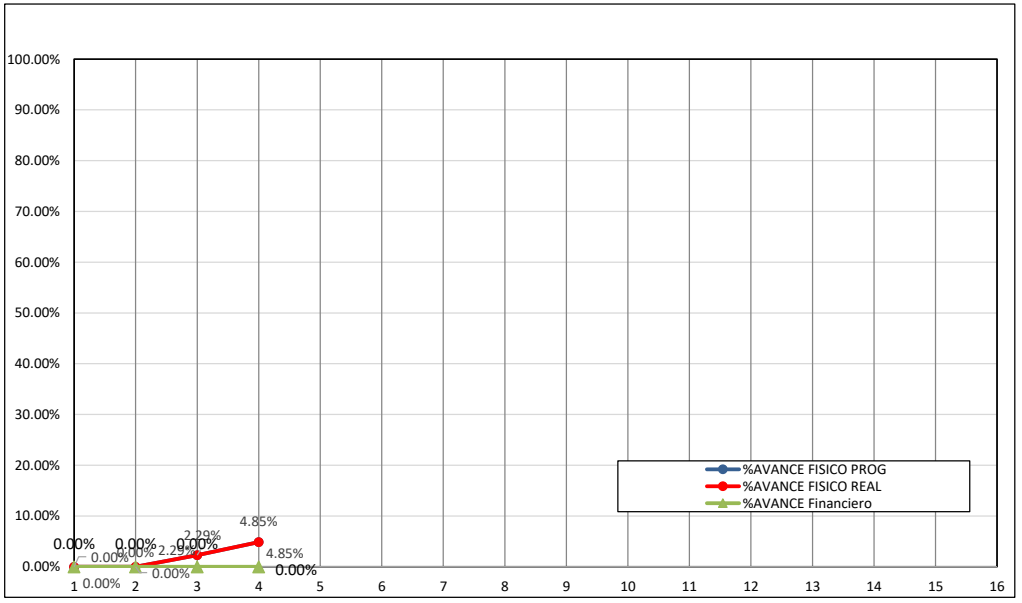

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
