GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **PF 001 D/2026 ENTREGA DE OBRA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA USO DOMÉSTICO EN CALLE OJO DE AGUA DEL MEZQUITE, CALLE LORETITO LADO ORIENTE Y CALLE VIÑEDOS RIBIER, PUERTECITO DE LA VIRGEN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES.**

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Residente: ARQ. BENJAMIN SALAZAR GONZALEZ

Contrato: PF 001 D/2026

Contratista: SAGUE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.


Inicio Vigente: jueves, 21 de mayo de 2026 **Días de Obra:** 45

Inicio Real: jueves, 21 de mayo de 2026 **Monto Contratado:** $ 77,409.99

Fin Vigente: sábado, 4 de julio de 2026 **Monto Ejercido:**

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	26/05/2026	4.64%	4.64%	0.00%
2	10/06/2026	46.66%	46.66%	0.00%
3	26/06/2026	83.27%	52.11%	0.00%
4	11/07/2026	100.00%		
5	26/07/2026	100.00%		
6	10/08/2026	100.00%		
7	26/08/2026	100.00%		
8	10/09/2026	100.00%		
9	26/09/2026	100.00%		
10	11/10/2026	100.00%		
11	26/10/2026	100.00%		
12	10/11/2026	100.00%		
13	26/11/2026	100.00%		
14	11/12/2026	100.00%		
15	26/12/2026	100.00%		
16	10/01/2027	100.00%		

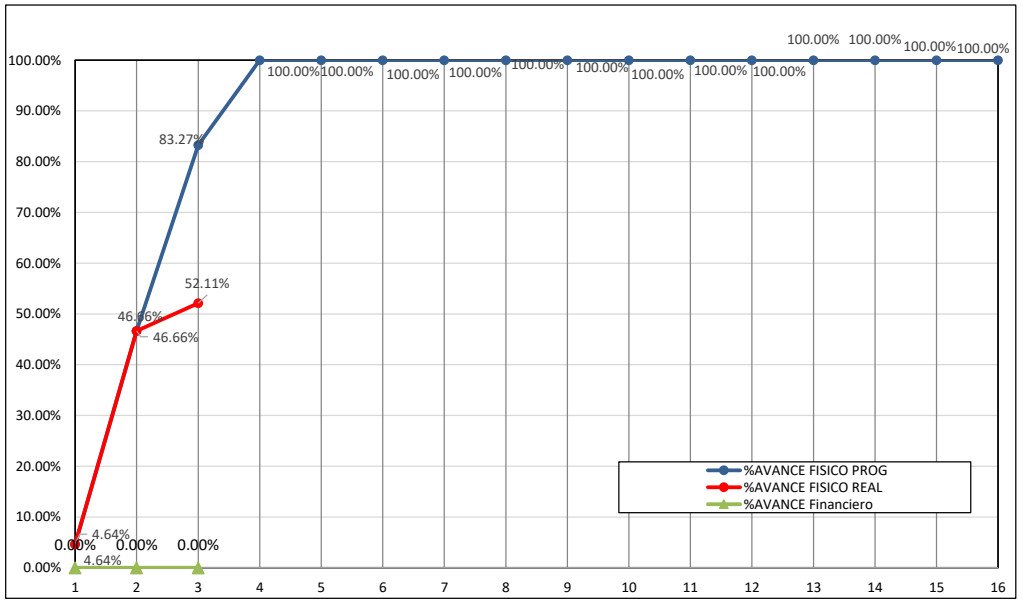

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
