GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **PF 001 F/2026 ESTUDIO DE IMPACTO LUMINICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO DE CARRETERA LIBRAMIENTO A LUIS MOYA A CALLE 10 DE NOVIEMBRE COLONIA 28 DE ABRIL, CALLE CANDILES TRAMO DE CALLE POZO NUEVO A CALLEPONIENTE Y DE CALLE PONIENTE A MITAD DE LA CALLE SAN MARTÍN EN LA COLONIA MACARIO J. GÓMEZ, CALLE PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LIBRAMIENTO A LUIS MOYA A CALLE 21 DE MARZO, COLONIA 28 DE ABRIL, CALLE SANTOS ZAPATA TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO DONDE TERMINA EMPEDRADO DE CALLE SANTOS ZAPATA A ENTRADA DE LA SECUNDARIA, LA CONCEPCIÓN, CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO DE CALLE JOSEFA O. DE DOMÍNGUEZ A FINAL DE LA CALLE, EN LA GUAYANA, CALLE SALUD TRAMO DE CALLE SAN JUAN A FINAL DE LA CALLE, EL TEPETATE, CALLE SINALOA TRAMO DE CALLE ZACATECAS A FINAL DE CALLE, ESTACIÓN CHICALOTE, CALLE FELIPE ÁNGELES TRAMO DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE FRANCISCO I. MADERO, PUERTECITO DE LA VIRGEN, CALLE 5 DE MAYO TRAMO DE LIBRAMIENTO A LUIS MOYA A CALLE 21 DE MARZO, COLONIA 28 DE ABRIL, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Contrato: PF 001 F/2026

Contratista: CR 18 DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.


Inicio Vigente: domingo, 21 de junio de 2026 **Días de Obra:** **15**

Inicio Real: domingo, 21 de junio de 2026 **Monto Contratado:** **$ 105,785.60**

Fin Vigente: miércoles, 1 de julio de 2026 **Monto Ejercido:** **$ 105,785.60**

Fin Real: miércoles, 1 de julio de 2026

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	28/06/2026	2.22%	2.22%	0.00%
2	05/07/2026	53.33%	53.33%	0.00%
3	12/07/2026	100.00%	100.00%	100.00%

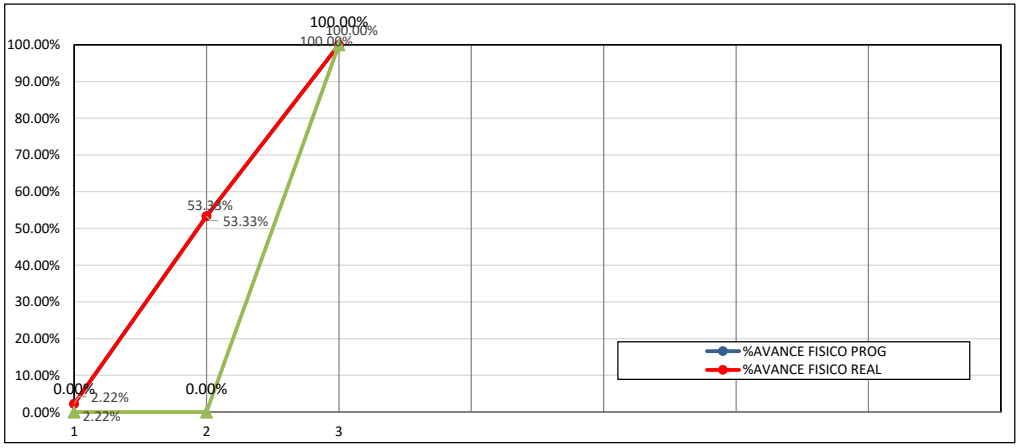

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
