# GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** **PF25 PF26 IP26 001/2026 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, SEÑALÉTICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y CICLOVÍA EN AV. SAUCE TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A CALLE PARAISO; Y CRUCEROS DE LA AV. REVOLUCIÓN TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A CALLE PARAISO**

**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Residente:** ING. RAMIRO ABINABAD DELGADILLO ESPARZA

**Contrato:** PF25 PF26 IP26 001/2026

**Contratista:** MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. - ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.


**Inicio Vigente:** miércoles, 17 de junio de 2026 **Días de Obra:** **75**

**Inicio Real:** miércoles, 17 de junio de 2026 **Monto Contratado:** **$11,566,361.96**

**Fin Vigente:** domingo, 30 de agosto de 2026 **Monto Ejercido:**

**Fin Real:** domingo, 30 de agosto de 2026

| SEMANA | FECHA | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/06/2026 | 9.00% | 9.33% | 50.00% |
| 2 | 09/07/2026 | | | |
| 3 | 25/07/2026 | | | |
| 4 | 09/08/2026 | | | |
| 5 | 24/08/2026 | | | |
| 6 | 08/09/2026 | | | |
| 7 | 24/09/2026 | | | |
| 8 | 09/10/2026 | | | |
| 9 | 25/10/2026 | | | |
| 10 | 09/11/2026 | | | |
| 11 | 24/11/2026 | | | |
| 12 | 09/12/2026 | | | |
| 13 | 25/12/2026 | | | |
| 14 | 09/01/2027 | | | |
| 15 | 24/01/2027 | | | |
| 16 | 08/02/2027 | | | |

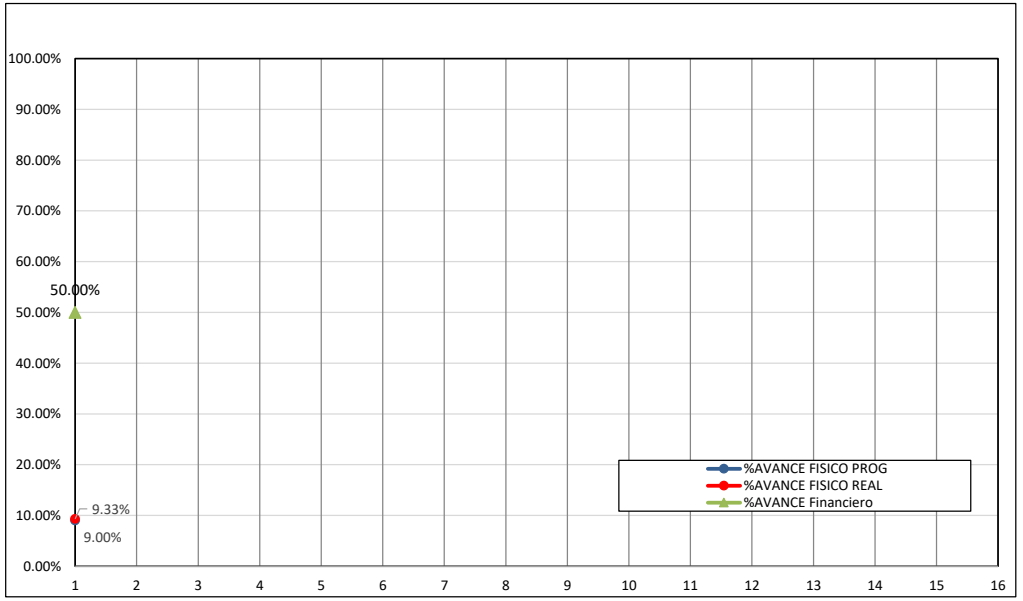


**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**
