GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FAISMUN 001/2026 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES)**

Ubicación: FRACC. LOS LIRIOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS

Residente: ARQ. JOSE ALFREDO DE VELASCO LARA

Contrato: FAISMUN 001/2026

Contratista: ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,


Inicio Vigente: sábado, 8 de agosto de 2026 **Días de Obra:** **90**

Inicio Real: sábado, 8 de agosto de 2026 **Monto Contratado:** **$3,361,646.01**

Fin Vigente: jueves, 5 de noviembre de 2026 **Monto Ejercido:**

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/08/2026	37.63%	37.98%	50.00%
2	30/09/2026	80.42%	80.95%	58.89%
3	31/10/2026	99.45%		
4	30/11/2026	100.00%		
5	31/12/2026	100.00%		
6	31/01/2027	100.00%		

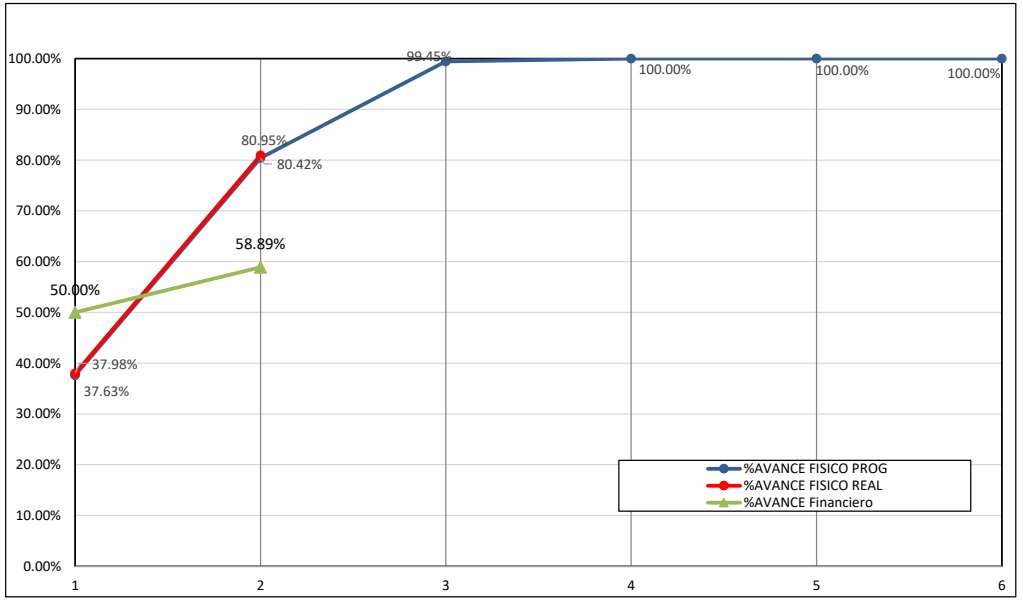

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
