GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FAISMUN 002/2026 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CALLE, SEÑALÉTICA, ALUMBRADO PÚBLICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LIBRAMIENTO A LUIS MOYA A CALLE 21 DE MARZO**

Ubicación: COLONIA 28 DE ABRIL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

Residente: ARQ. GUSTAVO DE SANTIAGO REYES

Contrato: FAISMUN 002/2026

Contratista: ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA ANTPAT, S.A. DE C.V.


Inicio Vigente: sábado, 15 de agosto de 2026 **Días de Obra:** **90**

Inicio Real: sábado, 15 de agosto de 2026 **Monto Contratado:** **$6,424,147.30**

Fin Vigente: jueves, 12 de noviembre de 2026 **Monto Ejercido:**

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/08/2026	6.71%	6.91%	50.00%
2	30/09/2026	31.07%	31.85%	54.93%
3	31/10/2026	93.74%		
4	30/11/2026	100.00%		
5	31/12/2026	100.00%		

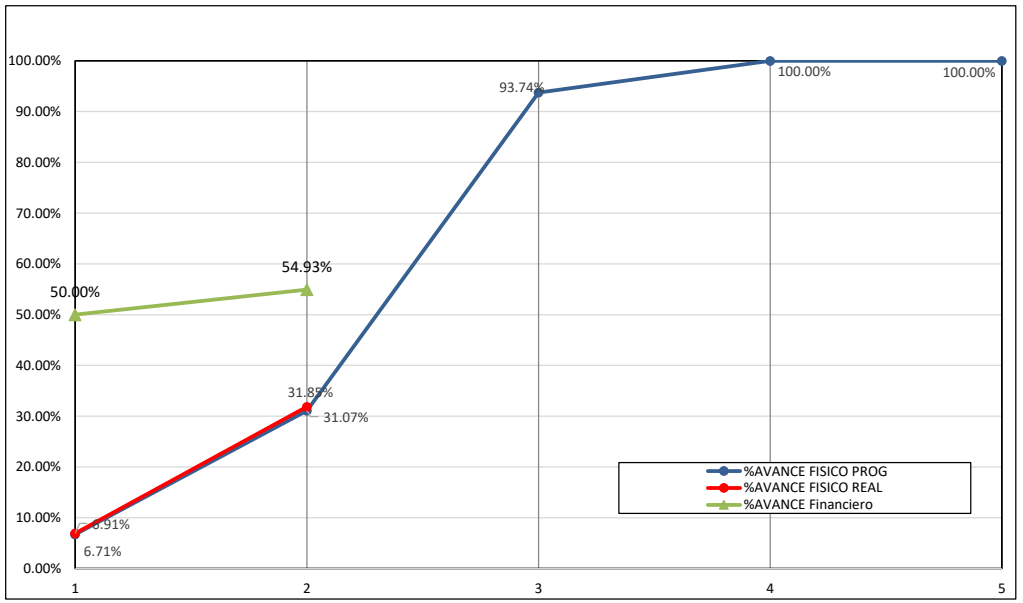

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
