GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FAISMUN 003/2026 REHABILITACIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALÉTICA, ALUMBRADO PÚBLICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO TRAMO DE LIBRAMIENTO A LUIS MOYA A CALLE 21 DE MARZO**

Ubicación: COLONIA 28 DE ABRIL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

Contrato: FAISMUN 003/2026

Residente: ARQ. GUSTAVO DE SANTIAGO REYES

Contratista: JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.


Inicio Vigente: sábado, 15 de agosto de 2026 **Días de Obra:** **90**

Inicio Real: sábado, 15 de agosto de 2026 **Monto Contratado:** **$6,470,205.44**

Fin Vigente: jueves, 12 de noviembre de 2026 **Monto Ejercido:**

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/08/2026	10.82%	10.93%	51.95%
2	30/09/2026	38.47%	38.93%	64.20%
3	30/10/2026	80.01%		
4	30/11/2026	100.00%		
5	30/12/2026			
6	30/01/2027			

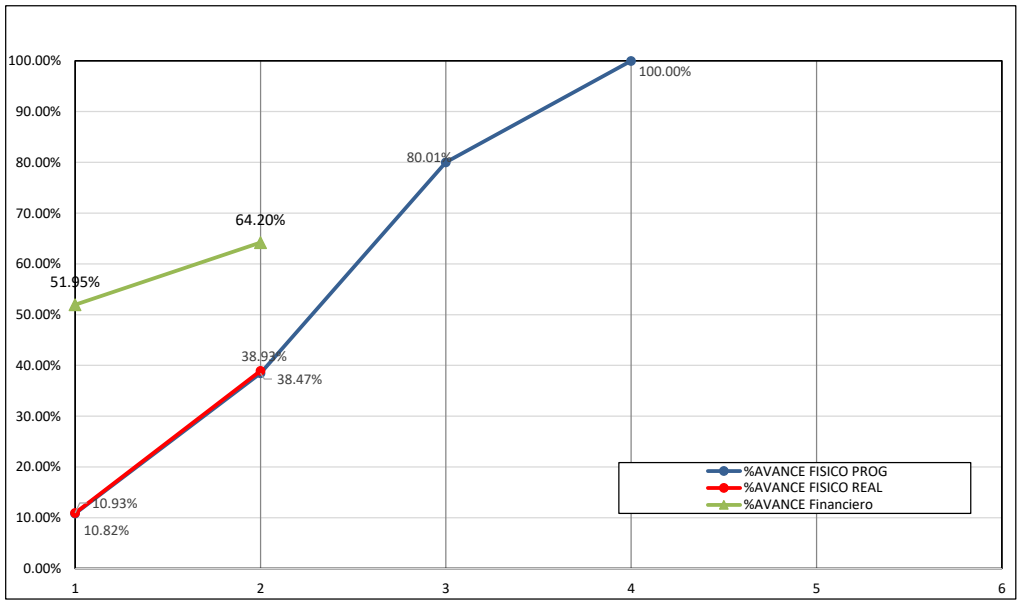

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
