GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FAISMUN 004/2026 REHABILITACIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALÉTICA, ALUMBRADO PÚBLICO, CICLOVÍA, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO DE CARRETERA LIBRAMIENTO A LUIS MOYA A CALLE 10 DE NOVIEMBRE**

Ubicación: COLONIA 28 DE ABRIL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

Contrato: FAISMUN 004/2026

Residente: ING. RAMIRO ABINABAD DELGADILLO ESPARZA

Contratista: URDAZ SUPERVISIONES, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V.


Inicio Vigente: sábado, 15 de agosto de 2026 **Días de Obra:** **120**

Inicio Real: sábado, 15 de agosto de 2026 **Monto Contratado:** **$13,295,039.21**

Fin Vigente: sábado, 12 de diciembre de 2026 **Monto Ejercido:**

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/08/2026	1.69%	1.98%	51.67%
2	30/09/2026	14.87%	14.96%	58.13%
3	30/10/2026	53.94%		
4	30/11/2026	92.36%		
5	30/12/2026	100.00%		
6	30/01/2027			
7	28/02/2027			

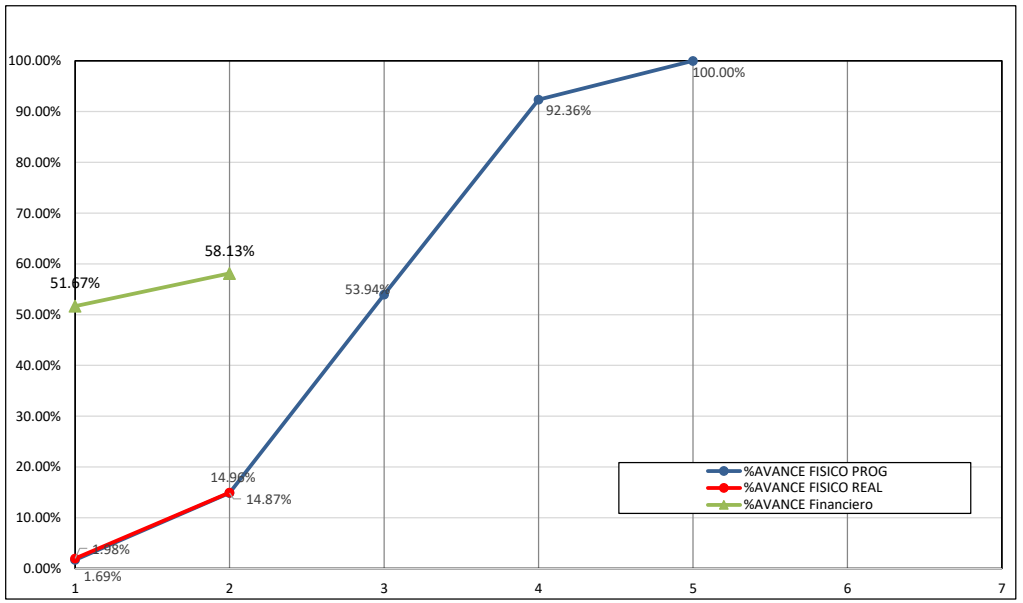

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
