GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FAISMUN 005/2026 RCONSTRUCCIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALÉTICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CANDILES TRAMO DE CALLE POZO NUEVO A CALLE PONIENTE Y DE CALLE PONIENTE A MITAD DE LA CALLE SAN MARTÍN**

FAISMUN 009/2026 REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALÉTICA Y ALUMBRADO PÚBLICO CALLE SINALOA TRAMO DE CALLE ZACATECAS A FINAL DE CALLE

Ubicación: COLONIA MACARIO J. GÓMEZ - COMUNIDAD ESTACIÓN CHICALOTE

Contrato: FAISMUN 005 009/2026

Residente: ARQ. HUMBERTO MIGUEL MELGAR ROMO

Contratista: EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.
C. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO


Inicio Vigente: sábado, 15 de agosto de 2026 **Días de Obra:** **90**

Inicio Real: sábado, 15 de agosto de 2026 **Monto Contratado:** **$8,906,593.27**

Fin Vigente: jueves, 12 de noviembre de 2026 **Monto Ejercido:**

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/08/2026	9.84%	9.92%	50.00%
2	30/09/2026	15.61%	15.97%	65.69%
3	30/10/2026	53.78%		
4	30/11/2026	97.09%		
5	30/12/2026	100.00%		
6	30/01/2027	100.00%		

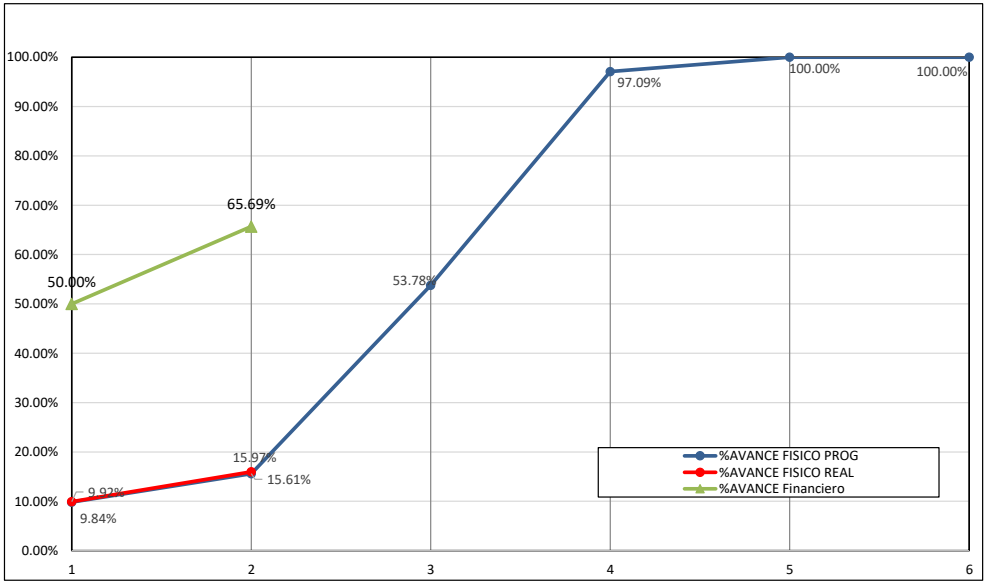

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
