GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FAISMUN 006/2026 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CALLE, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE CALLE FELIPE ÁNGELES TRAMO DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE FRANCISCO I. MADERO**

FAISMUN 011/2026 CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PAVIMENTO Y SEÑALETICA CALLE VIÑEDOS SANTA RITA TRAMO DE AV. CONSTITUCIÓN A CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS

Ubicación: PUERTECITO DE LA VIRGEN - EXVIÑEDOS GUADALUPE

Residente: ARQ. BENJAMIN SALAZAR GONZALEZ

Contrato: FAISMUN 006 011/2026

Contratista: CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.,


Inicio Vigente: sábado, 15 de agosto de 2026 **Días de Obra:** **60**

Inicio Real: sábado, 15 de agosto de 2026 **Monto Contratado:** **$5,445,074.37**

Fin Vigente: martes, 13 de octubre de 2026 **Monto Ejercido:**

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	29/08/2026	45.76%	54.54%	50.00%
2	12/09/2026	63.59%	65.91%	50.00%
3	26/09/2026	86.56%	87.24%	95.54%
4	10/10/2026	99.76%		
5	24/10/2026	100.00%		
6	07/11/2026	100.00%		
7	21/11/2026	100.00%		
8	05/12/2026	100.00%		

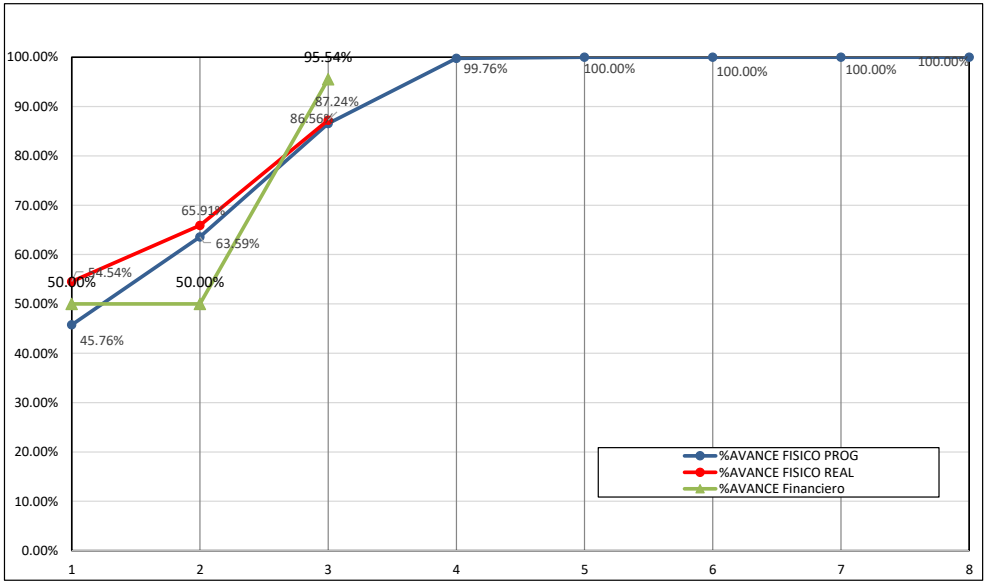

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
