GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FAISMUN 007/2026 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; EN CALLE PRIVADA COLÓN TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A JOSÉ MARÍA MORELOS**

Ubicación: ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Residente: ARQ. CARLOS EMMANUEL PERALTA BENITEZ

Contrato: FAISMUN 007/2026

Contratista: SOLCYD, S.A. DE C.V.,

Inicio Vigente: sábado, 15 de agosto de 2026

Días de Obra: **30**

Inicio Real: sábado, 15 de agosto de 2026


Monto Contratado: **$1,296,200.38**

Fin Vigente: domingo, 13 de septiembre de 2026

Monto Ejercido:

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/08/2026	61.44%	62.26%	46.53%
2	30/09/2026	100.00%	100.00%	92.44%
3	30/10/2026	100.00%	100.00%	93.07%
4	30/11/2026	100.00%	100.00%	100.00%

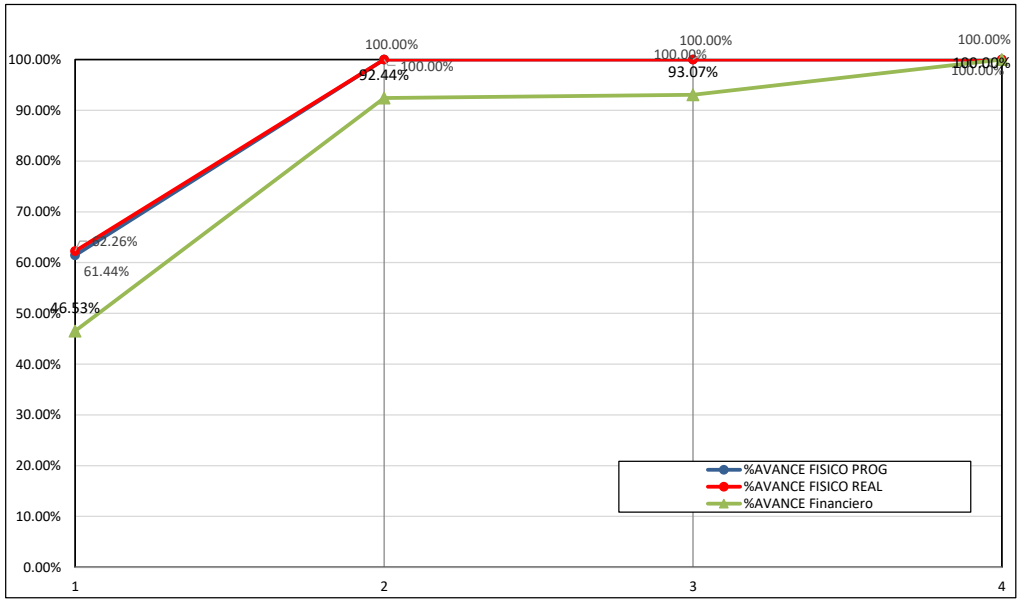

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
