GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FAISMUN 008/2026 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, CALLE, SEÑALETICA, ALUMBRADO PÚBLICO, RED DRENAJE Y RED DE AGUA POTALBE CALLE SALUD TRAMO DE CALLE SAN JUAN A FINAL DE LA CALLE**

Ubicación: COMUNIDAD EL TEPETATE, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Residente: ARQ. JOSE DE JESUS ESPARZA CALDERA

Contrato: FAISMUN 008/2026

Contratista: VILLASTAPA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V.,

Inicio Vigente: martes, 11 de agosto de 2026

Días de Obra: **60**

Inicio Real: martes, 11 de agosto de 2026


Monto Contratado: **$2,372,575.58**

Fin Vigente: viernes, 9 de octubre de 2026

Monto Ejercido:

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/08/2026	9.89%	10.26%	50.00%
2	30/09/2026	65.26%	66.29%	58.82%
3	30/10/2026	100.00%		
4	30/11/2026			
5	31/12/2026			
6	31/01/2027			
7	03/03/2027			

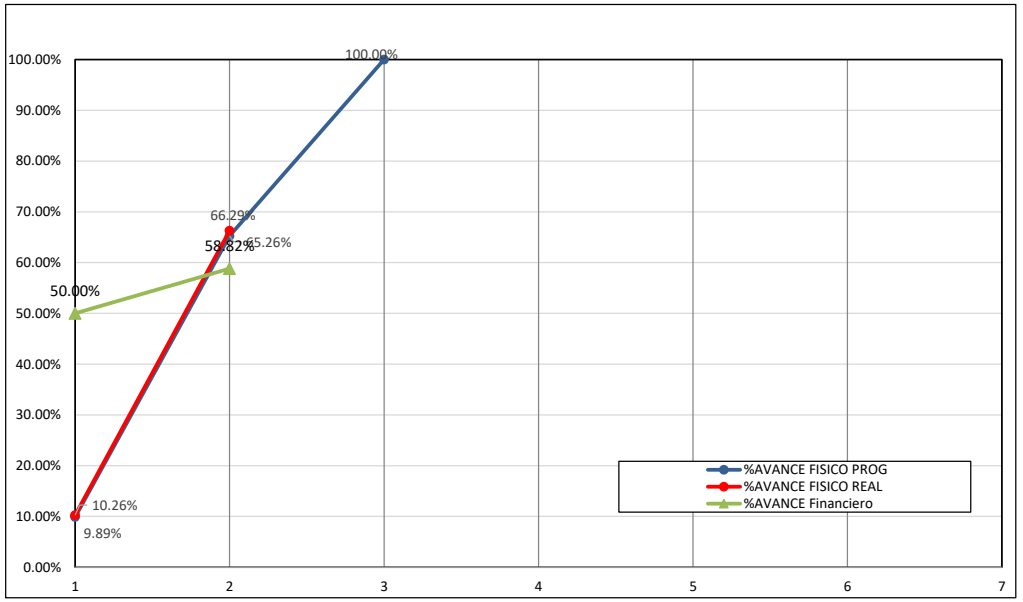

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
