GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FAISMUN 010/2026 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, CALLE, SEÑALÉTICA, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE CALLE SEGURIDAD PÚBLICA TRAMO CALLE JUSTICIA A CALLE EDUCACIÓN**

Ubicación: FRACC. SAN JOSÉ DEL BARRANCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Residente: ARQ. JOSE ALFREDO DE VELASCO LARA

Contrato: FAISMUN 010/2026

Contratista: FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.


Inicio Vigente: martes, 11 de agosto de 2026 **Días de Obra:** **120**

Inicio Real: martes, 11 de agosto de 2026 **Monto Contratado:** **$10,880,980.42**

Fin Vigente: martes, 8 de diciembre de 2026 **Monto Ejercido:**

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/08/2026	8.67%	9.59%	48.56%
2	30/09/2026	28.32%	29.62%	55.12%
3	30/10/2026	53.74%		
4	30/11/2026	91.72%		
5	31/12/2026	100.00%		
6	31/01/2027			
7	03/03/2027			
8	03/04/2027			

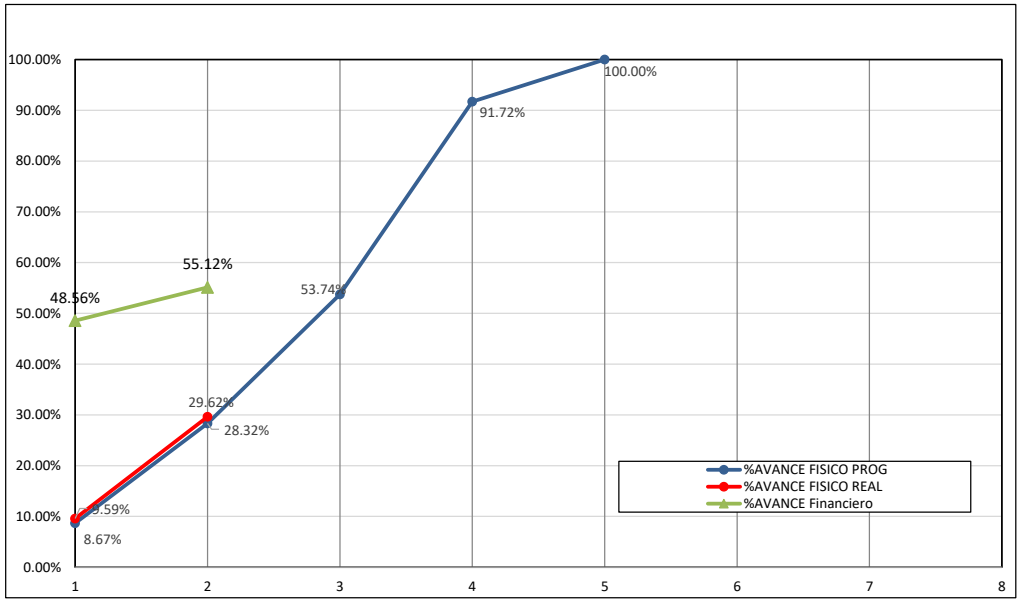

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
