GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FAISMUN 012/2026 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE; RED DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCIÓN DE CALLE, PAVIMENTO, SEÑALETICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SANTOS ZAPATA TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO DONDE TERMINA EMPEDRADO DE CALLE SANTOS ZAPATA A ENTRADA DE LA SECUNDARIA**

Ubicación: COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: FAISMUN 012/2026

Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Contratista: SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VERANTA, S. DE R.L. DE C.V.,


Inicio Vigente: martes, 11 de agosto de 2026 **Días de Obra:** **60**

Inicio Real: martes, 11 de agosto de 2026 **Monto Contratado:** **$2,120,550.48**

Fin Vigente: viernes, 9 de octubre de 2026 **Monto Ejercido:**

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/08/2026	18.69%	18.93%	50.00%
2	30/09/2026	50.89%	50.97%	53.74%
3	30/10/2026	100.00%		
4	30/11/2026			
5	31/12/2026			
6	31/01/2027			

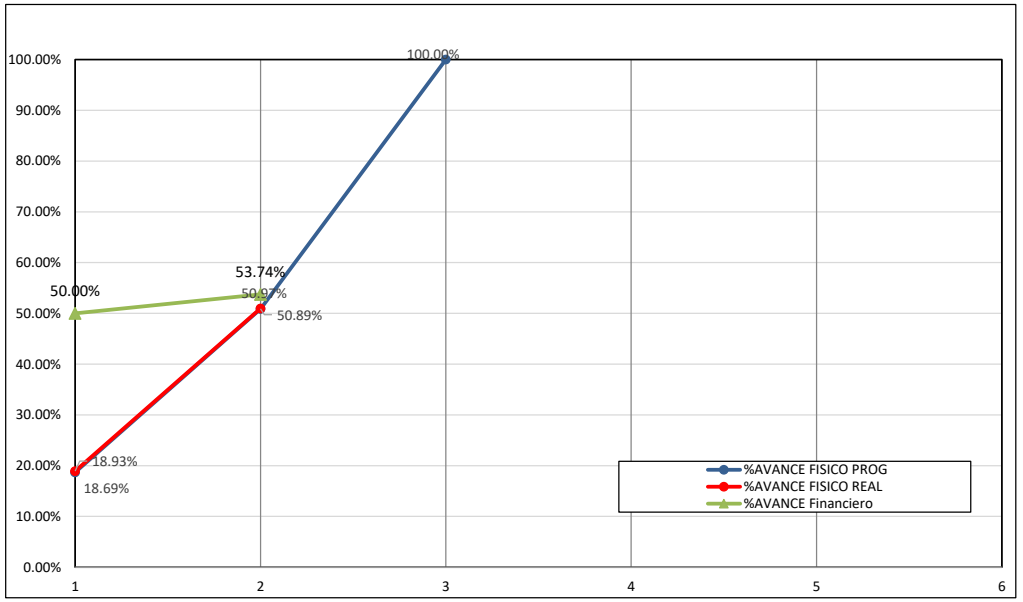

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
