GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FORTAMUN 001/2026 REHABILITACIÓN EN COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO, RECEPCIÓN, OFICINA ADMINISTRATIVA Y PATIO MECÁNICO**

Ubicación: FRACC. HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, ESTADO DE AGUASCALIENTES

Residente: ARQ. JOSE DE JESUS ESPARZA CALDERA

Contrato: FORTAMUN 001/2026

Contratista: DAPAC DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.,


Inicio Vigente: sábado, 5 de septiembre de 2026 **Días de Obra:** **75**

Inicio Real: sábado, 5 de septiembre de 2026 **Monto Contratado:** **$2,825,552.56**

Fin Vigente: miércoles, 18 de noviembre de 2026 **Monto Ejercido:**

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/09/2026	14.35%	15.95%	50.00%
2	31/10/2026	76.90%		
3	30/11/2026	100.00%		
4	31/12/2026			
5	31/01/2027			
6	03/03/2027			
7	03/04/2027			

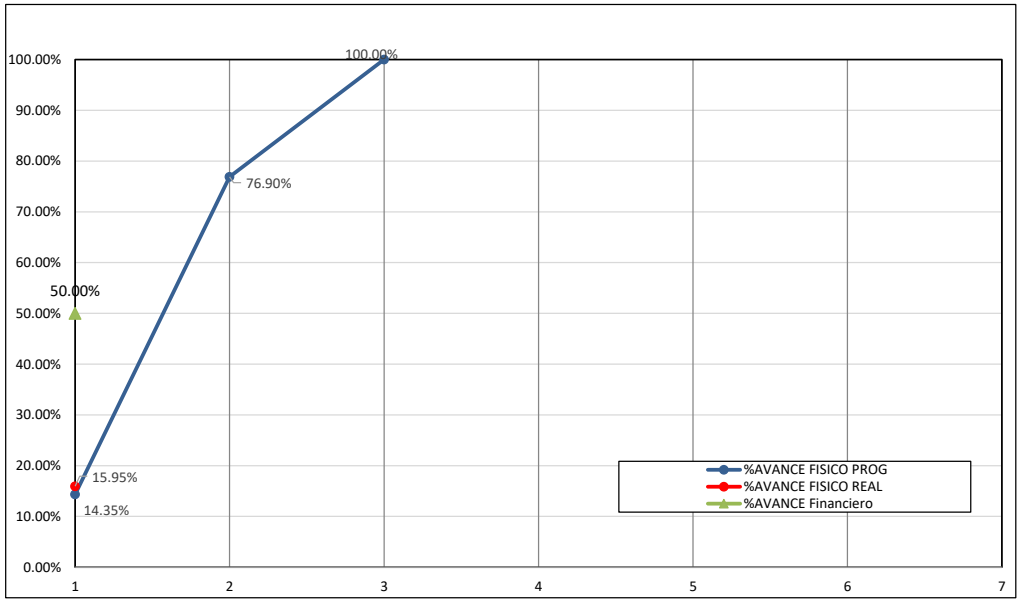

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
