GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FORTAMUN 002/2026 REHABILITACIÓN EN COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD, ESTACIONAMIENTOS**

Ubicación: FRACC. HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, ESTADO DE AGUASCALIENTES

Residente: ARQ. JOSE DE JESUS ESPARZA CALDERA

Contrato: FORTAMUN 002/2026

Contratista: CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.,


Inicio Vigente: sábado, 5 de septiembre de 2026 **Días de Obra:** **75**

Inicio Real: sábado, 5 de septiembre de 2026 **Monto Contratado:** **$3,041,296.68**

Fin Vigente: miércoles, 18 de noviembre de 2026 **Monto Ejercido:**

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/09/2026	21.05%	21.95%	50.00%
2	31/10/2026	99.27%		
3	30/11/2026	100.00%		
4	30/12/2026			
5	29/01/2027			
6	28/02/2027			
7	30/03/2027			

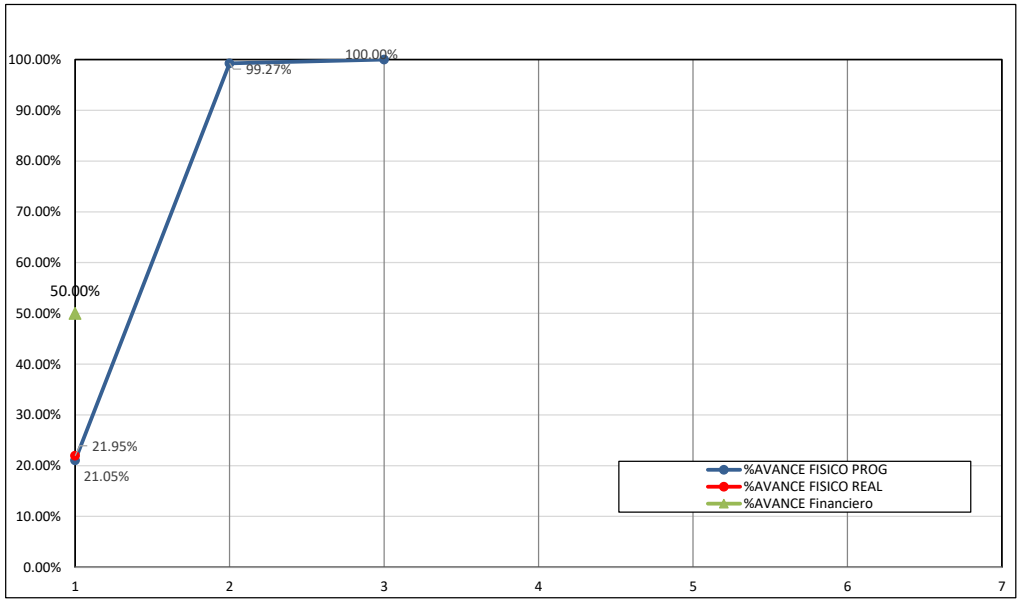

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
