GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FR 001/2026 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, SEÑALIZACIÓN EN VIALIDADES, EQUIPAMIENTO URBANO Y JARDINERÍA EN LA CALLE PRIV COLÓN DE CALLE MORELOS A AV. BENITO JUÁREZ**

Ubicación: EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, EN EL ESTADO DE AGUASCALENTES

Residente: ARQ. CARLOS EMMANUEL PERALTA BENITEZ

Contrato: FR 001/2026

Contratista: CONSTRUARES, S.A. DE C.V.,

Inicio Vigente: martes, 15 de septiembre de 2026

Días de Obra: **30**

Inicio Real: martes, 15 de septiembre de 2026


Monto Contratado: **$1,441,143.63**

Fin Vigente: miércoles, 14 de octubre de 2026

Monto Ejercido:

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/09/2026	50.07%	50.59%	50.00%
2	30/10/2026	100.00%		
3	15/11/2026			
4	30/11/2026			

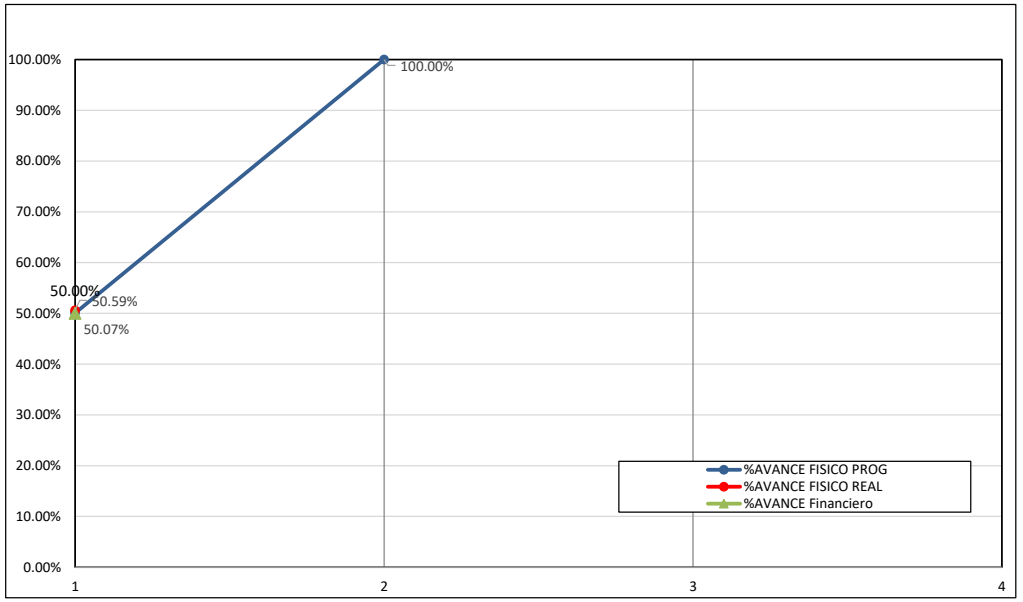

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
