GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **FR 002/2026 CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE (DESCARGA DOMICILIARIA EXTERIOR) Y RED DE AGUA POTABLE (TOMA DOMICILIARIA RAMAL), EN CALLE CANDILES TRAMO DE CALLE POZO NUEVO A CALLE PONIENTE Y DE CALLE PONIENTE A MITAD DE LA CALLE SAN MARTÍN EN LA COLONIA MACARIO J. GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Ubicación: EN LA COLONIA MACARIO J. GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Residente: ARQ. HUMBERTO MIGUEL MELGAR ROMO

Contrato: FR 002/2026

Contratista: JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO


Inicio Vigente: martes, 1 de septiembre de 2026 **Días de Obra:** 7

Inicio Real: martes, 1 de septiembre de 2026 **Monto Contratado:** $91,802.95

Fin Vigente: lunes, 7 de septiembre de 2026 **Monto Ejercido:**

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	30/09/2026	100.00%	100.00%	0.00%
2	30/10/2026	100.00%		

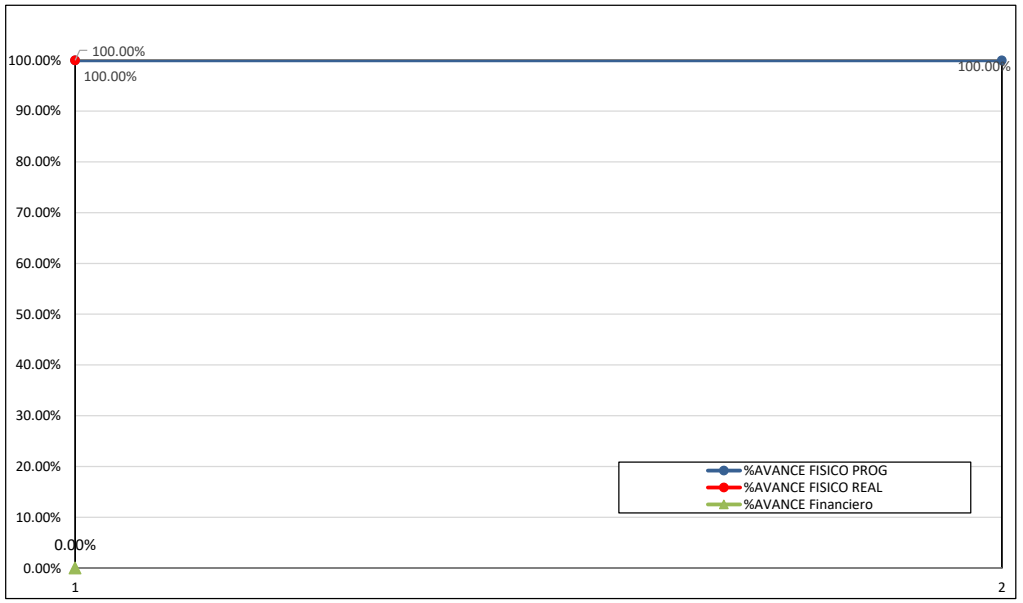

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
