GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **IP 001/2026 REGENERACIÓN URBANA DE LA AV. SAUCE Y AV. REVOLUCIÓN, CON PINTURA EN FACHADAS**

Ubicación: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Residente: ARQ. CARLOS EMMANUEL PERALTA BENITEZ

Contrato: IP 001/2026

Contratista: ALAN DANIEL SILVA ÁVILA


Inicio Vigente: martes, 18 de agosto de 2026 **Días de Obra:** **15**

Inicio Real: martes, 18 de agosto de 2026 **Monto Contratado:** **$522,449.37**

Fin Vigente: martes, 1 de septiembre de 2026 **Monto Ejercido:** **$522,449.37**

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	01/09/2026	100.00%	100.00%	0.00%
2	16/09/2026	100.00%	100.00%	0.00%
3	02/10/2026	100.00%	100.00%	100.00%

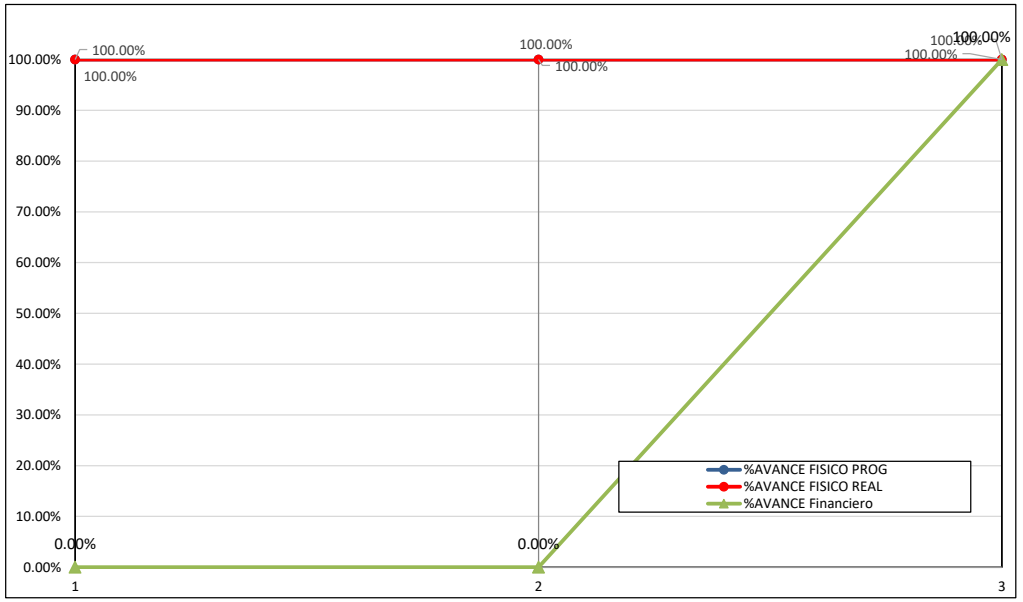

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
