GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **PF 001 A/2026 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - TRAMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 1 OBRA (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL VÍAS DE FERROCARRIL LÍNEA "A" Km 606+242.159 EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES).**

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Contrato: PF 001 A/2026

Contratista: C. Julio Cesar Ríos Vázquez


Inicio Vigente: jueves, 12 de febrero de 2026 **Días de Obra:** 180

Inicio Real: lunes, 10 de agosto de 2026 **Monto Contratado:** $ 113,328.96

Fin Vigente: lunes, 10 de agosto de 2026 **Monto Ejercido:**

Fin Real: lunes, 10 de agosto de 2026

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/02/2026	0.00%	0.00%	0.00%
2	28/02/2026	0.00%	0.00%	0.00%
3	15/03/2026	25.71%	25.71%	0.00%
4	30/03/2026	25.71%	25.71%	0.00%
5	15/04/2026	67.99%	67.99%	0.00%
6	30/04/2026	67.99%	67.99%	67.99%
7	15/05/2026	74.03%	74.03%	67.99%
8	30/05/2026	74.03%	74.03%	67.99%
9	14/06/2026	80.06%	80.06%	67.99%
10	30/06/2026	80.06%	80.06%	67.99%
11	15/07/2026	89.12%	89.12%	67.99%
12	30/07/2026	92.14%	92.14%	67.99%
13	15/08/2026	100.00%	100.00%	67.99%
14	30/08/2026	100.00%	100.00%	100.00%

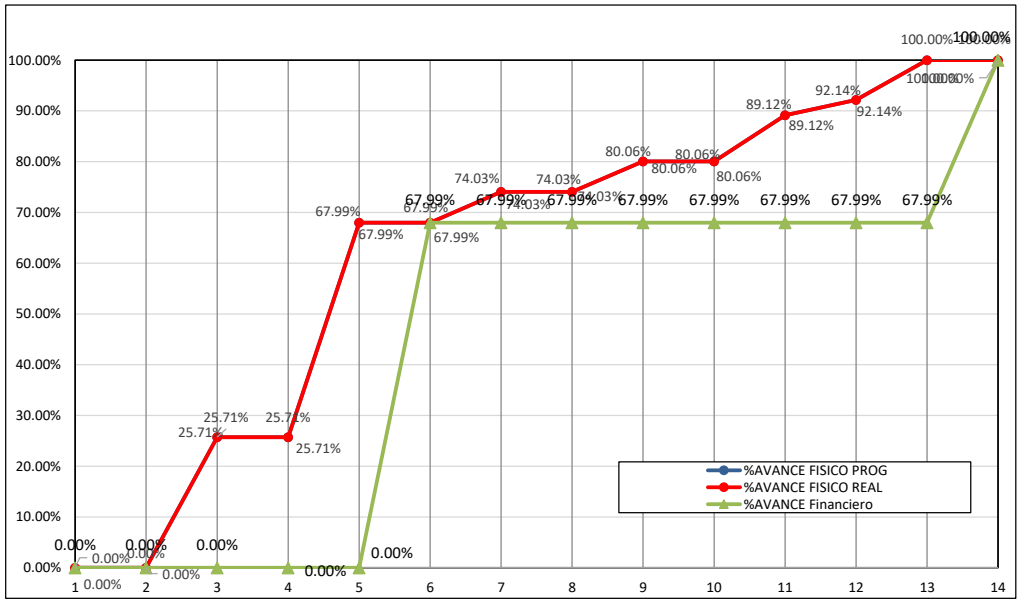

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
