GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **PF 001 E/2026 TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 10 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA).**

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Contrato: PF 001 E/2026

Contratista: C. JESUS ADRIAN CASTILLO SERNA

Inicio Vigente: martes, 9 de junio de 2026

Días de Obra: 210

Inicio Real: martes, 9 de junio de 2026


Monto Contratado: $ 271,989.47

Fin Vigente: lunes, 4 de enero de 2027

Monto Ejercido:

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	16/06/2026	0.00%	0.00%	0.00%
2	01/07/2026	0.00%	0.00%	0.00%
3	17/07/2026	0.00%	0.00%	0.00%
4	01/08/2026	0.00%	0.00%	0.00%
5	16/08/2026	24.26%	24.26%	11.43%
6	31/08/2026	30.67%	30.67%	11.43%
7	16/09/2026	54.93%	54.93%	11.43%
8	30/09/2026	61.35%	61.35%	11.43%
9	16/10/2026			
10	31/10/2026			
11	15/11/2026			
12	30/11/2026			
13	16/12/2026			
14	31/12/2026			
15	15/01/2027			
16	30/01/2027			

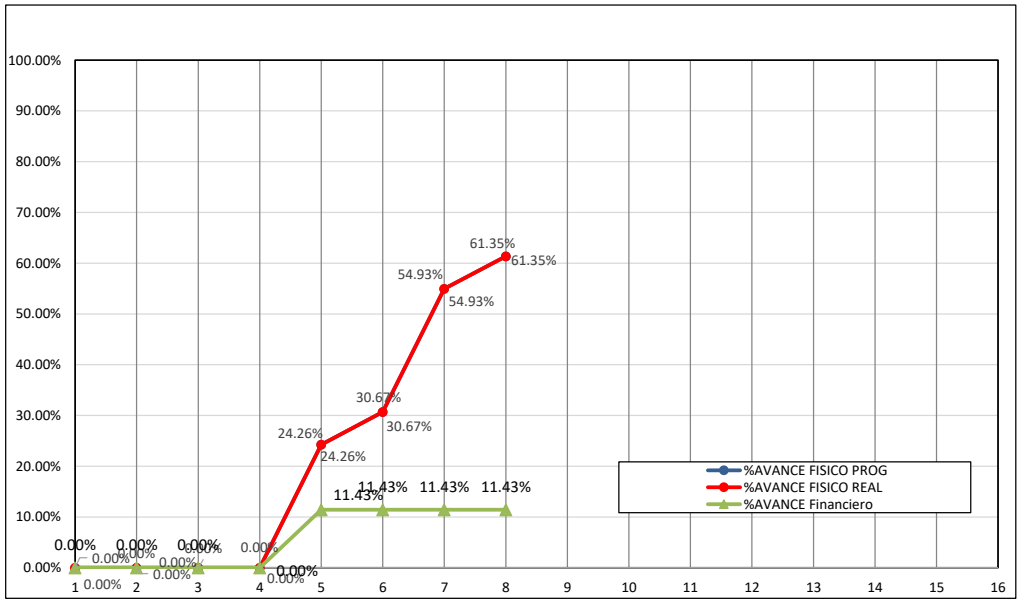

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
