GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **PF 001 E2/2026 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - TRABAJOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO (CONFORME A TERMINOS DE REFERENCIA) Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE TIPO PLANIMETRICO EN COORDENADAS UTM, REVISION DE VÉRTICES EN CAMPO (CONFORME A TERMINOS DE REFERENCIA)**

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Contrato: PF 001 E2/2026

Contratista: INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.


Inicio Vigente: martes, 2 de junio de 2026 **Días de Obra:** 30

Inicio Real: martes, 2 de junio de 2026 **Monto Contratado:** $ 406,112.58

Fin Vigente: miércoles, 1 de julio de 2026 **Monto Ejercido:**

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	09/06/2026	0.00%	0.00%	0.00%
2	24/06/2026	6.16%	6.16%	0.00%
3	10/07/2026	6.16%	6.16%	0.00%
4	25/07/2026	6.16%	6.16%	0.00%
5	09/08/2026	6.16%	6.16%	0.00%
6	24/08/2026	6.16%	6.16%	0.00%
7	09/09/2026	6.16%	6.16%	0.00%
8	24/09/2026	6.16%	6.16%	5.95%
9	10/10/2026			
10	25/10/2026			
11	09/11/2026			
12	24/11/2026			
13	10/12/2026			
14	25/12/2026			
15	09/01/2027			
16	24/01/2027			

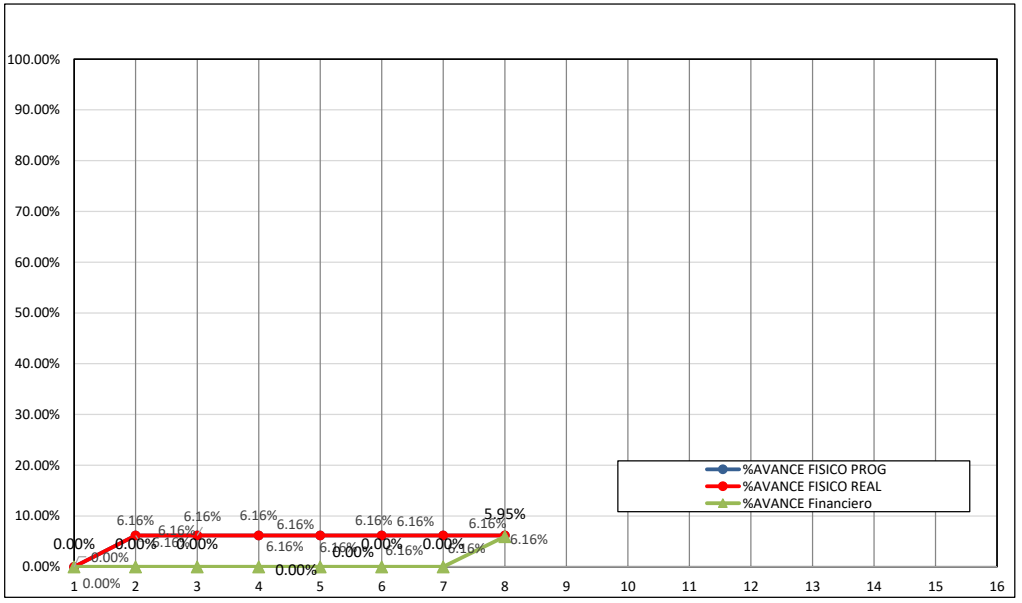

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
