GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **PF 001 G/2026 TRAMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 1 OBRA (CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES), FRACC. LOS LIRIOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES).**

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Residente: ARQ. JOSE ALFREDO DE VELASCO LARA

Contrato: PF 001 G/2026

Contratista: C. JULIO CESAR RIOS VAZQUEZ


Inicio Vigente: viernes, 3 de julio de 2026 **Días de Obra:** 135

Inicio Real: viernes, 3 de julio de 2026 **Monto Contratado:** $ 115,142.21

Fin Vigente: sábado, 14 de noviembre de 2026 **Monto Ejercido:** $ 115,142.21

Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	15/07/2026	28.16%	28.16%	
2	30/07/2026	28.16%	28.16%	
3	15/08/2026	38.14%	38.14%	
4	30/08/2026	44.79%	44.79%	
5	15/09/2026	51.44%	51.44%	
6	30/09/2026	58.09%	58.09%	
7	15/10/2026			
8	30/10/2026			
9	15/11/2026			
10	30/11/2026			

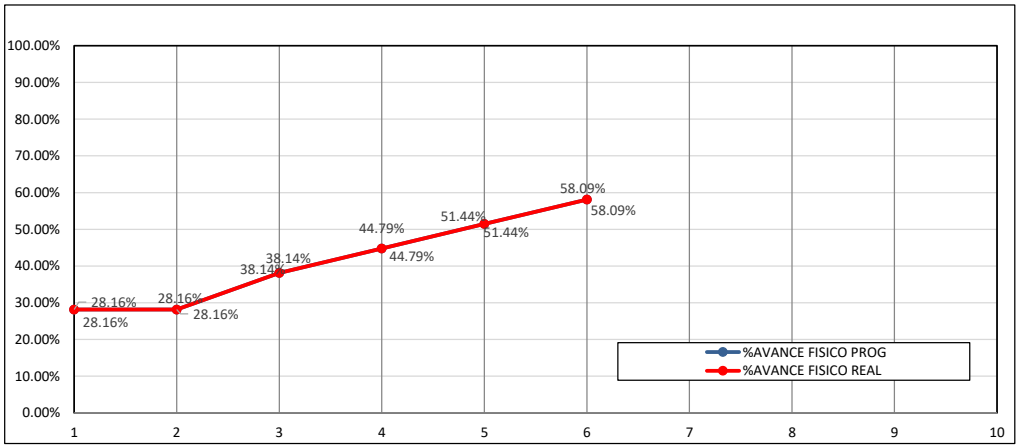

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
