GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: **PF25 PF26 IP26 001/2026 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, SEÑALÉTICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y CICLOVÍA EN AV. SAUCE TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A CALLE PARAISO; Y CRUCEROS DE LA AV. REVOLUCIÓN TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A CALLE PARAISO**

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Residente: ING. RAMIRO ABINABAD DELGADILLO ESPARZA

Contrato: PF25 PF26 IP26 001/2026

Contratista: MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. - ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.


Inicio Vigente: miércoles, 17 de junio de 2026 **Días de Obra:** **75**

Inicio Real: miércoles, 17 de junio de 2026 **Monto Contratado:** **$12,977,550.63**

Fin Vigente: domingo, 30 de agosto de 2026 **Monto Ejercido:** **$ 12,976,575.38**

Fin Real: domingo, 30 de agosto de 2026 SOLICITA NOTA DE CREDITO

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	20/06/2026	2.40%	2.40%	44.56%
2	04/07/2026	7.89%	7.89%	45.37%
3	18/07/2026	41.24%	41.24%	48.07%
4	01/08/2026	71.90%	72.02%	50.32%
5	15/08/2026	94.56%	94.82%	59.47%
6	29/08/2026	99.86%	99.86%	72.91%
7	12/09/2026	100.00%	100.00%	96.15%
8	26/09/2026	100.00%	100.00%	100.00%

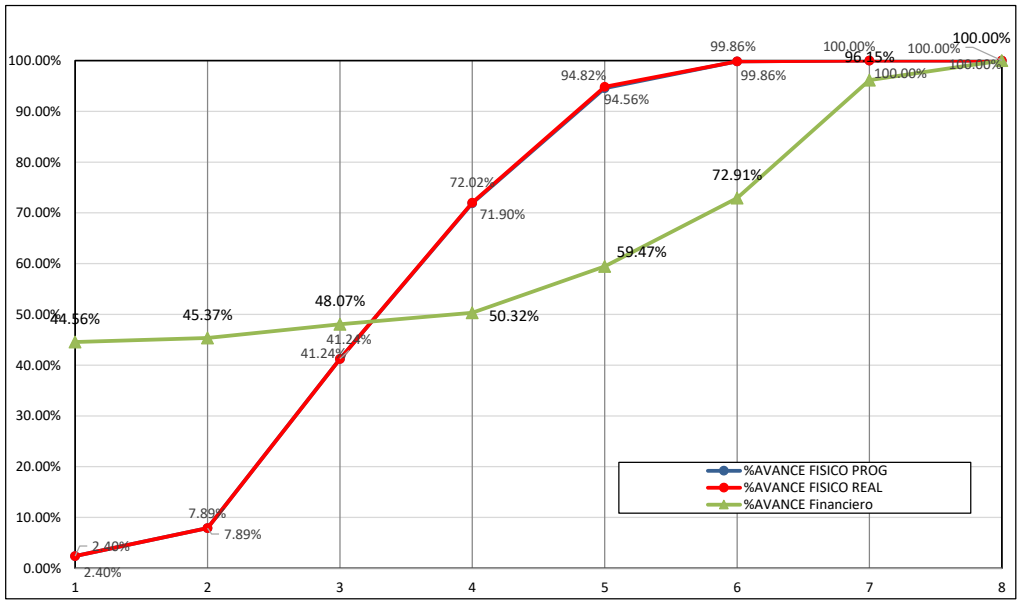

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
